



Interventi di Rinnovo delle Infrastrutture Idriche, Fognarie e Metanifere. Via Isonzo Comune Ancona

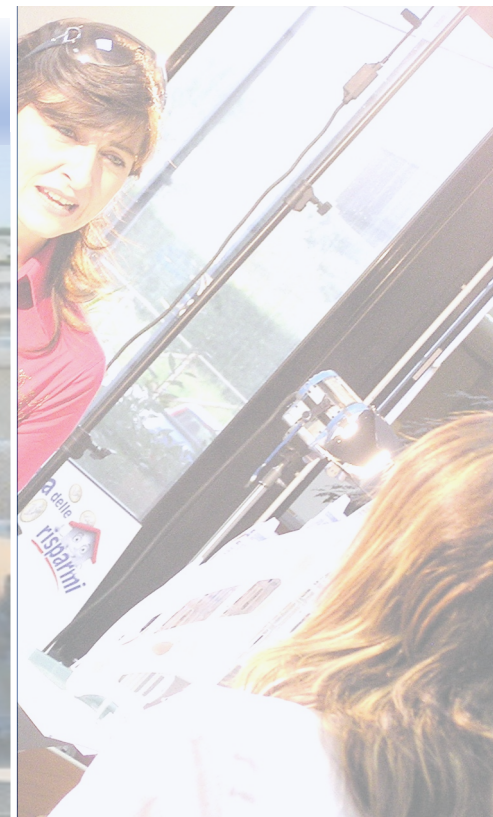

16 Marzo 26

Comune di Ancona

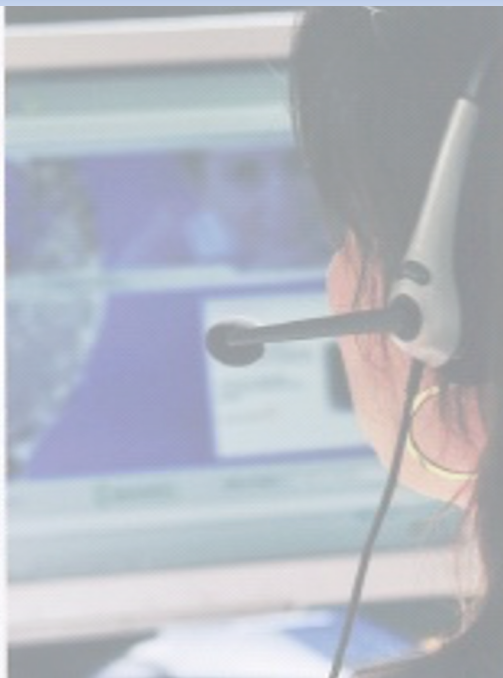

viva servizi

Interventi di Rinnovo delle Infrastrutture Idriche, Fognarie e Metanifere

 Via Isonzo e Via del Conero – Comune di Ancona



Manutenzione straordinaria programmata per le reti acquedotto, fognatura e gas nel tratto di Via Isonzo: **tratto compreso da Via Rodi fino a Via del Conero, nonché in un tratto di Via del Conero.**

 Rete Acquedotto – Interventi Previsti  Sostituzione Condotta di Adduzione Condotta esistente: ghisa grigia DN 200 → Nuova condotta in ghisa sferoidale DN 200  Lunghezza: ~700 m  Sostituzione Condotta di Distribuzione Condotta esistente: ET DN 80 → Nuova condotta in PEAD De 110  Lunghezza: ~450 m  Rinnovo Allacci di Utenza N. 37 allacci esistenti da rinnovare	 Rete Fognaria – Interventi Previsti  Rinnovo Tratti di Condotta • Condotte esistenti: calcestruzzo 600 × 400 • → Nuova condotta in PVC De 400 •  Lunghezza complessiva: ~120 m  Rinnovo Allacci di Utenza • Circa 10 allacci da rinnovare  Caditoie Stradali •  Riposizionamento delle caditoie esistenti •  Sostituzione solo se danneggiate durante i lavori	 Rete Gas – Interventi Previsti (in convz.ne con Edma Reti Gas)  Rinnovo Allacci di Utenza •  N. 35 allacci da rinnovare  Condotta Principale  Non è previsto il rifacimento della condotta esistente
---	---	---

Tali lavori sono necessari per garantire un adeguato servizio alle utenze e per migliorare le infrastrutture esistenti.

viva servizi


Manutenzione straordinaria programmata per le reti acquedotto, fognatura e gas nel tratto di Via Isonzo: tratto compreso da Via Rodi fino a Via del Conero, nonché in un tratto di Via del Conero.



Analisi Tecnica delle Interferenze con la Viabilità

Rischi connessi con la presenza di:

- 2 plessi scolastici (Scuola infanzia Montessori e Cristo Re)
- 1 Luogo di culto (S. Maria dei Servi)
- Attività commerciali varie (pasticceria, centro estetico..etc..etcc);
- Presenza di stalli di sosta in entrambi i lati della carreggiata;
- Doppio senso di circolazione sul tratto interessato dei lavori

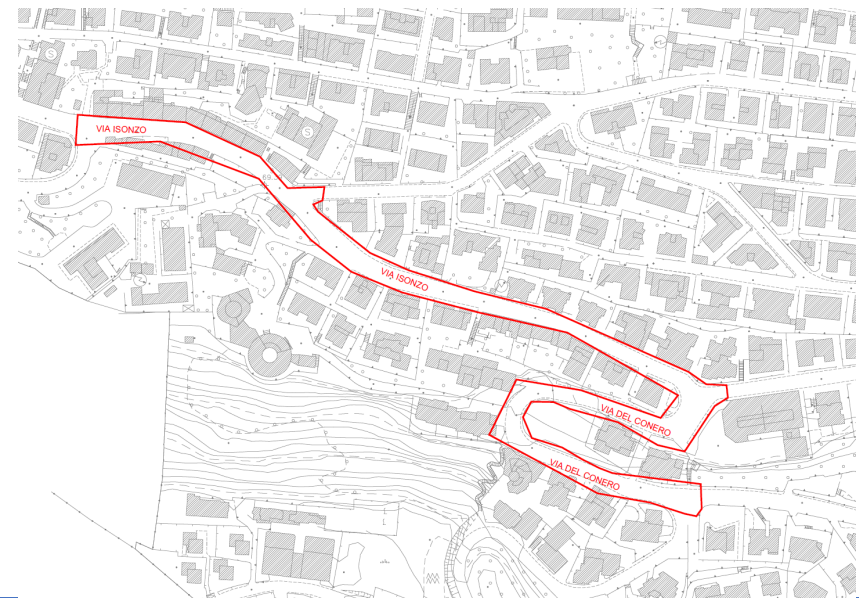

IV FASI


I FASE: Rifacimento infrastrutture interrate (scavo, posa tubo, riempimento ripristino asfalto)- **Via Isonzo**

II FASE: Bonifica carreggiata asfaltatura strada- **Via Isonzo**


III FASE: Rifacimento infrastrutture interrate (scavo, posa tubo, riempimento ripristino asfalto)- **Via Conero**

IV FASE: Bonifica carreggiata asfaltatura strada- **Via Conero**

Analisi Tecnica delle Interferenze con la Viabilità

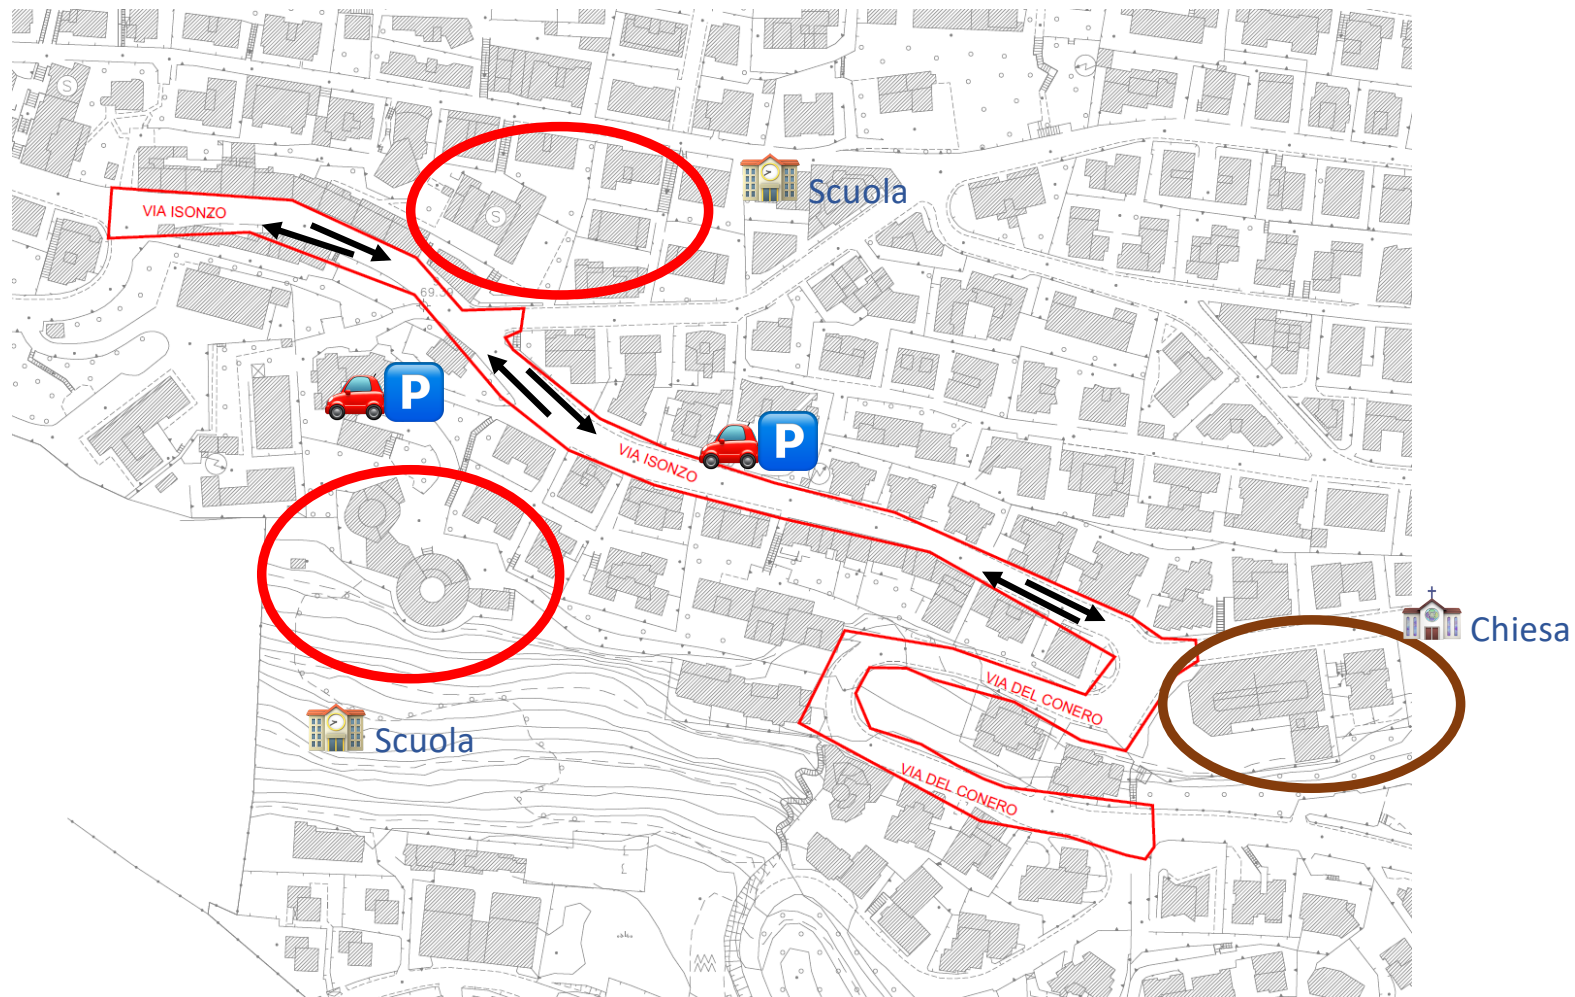


FASE I: Organizzazione del Cantiere prevista

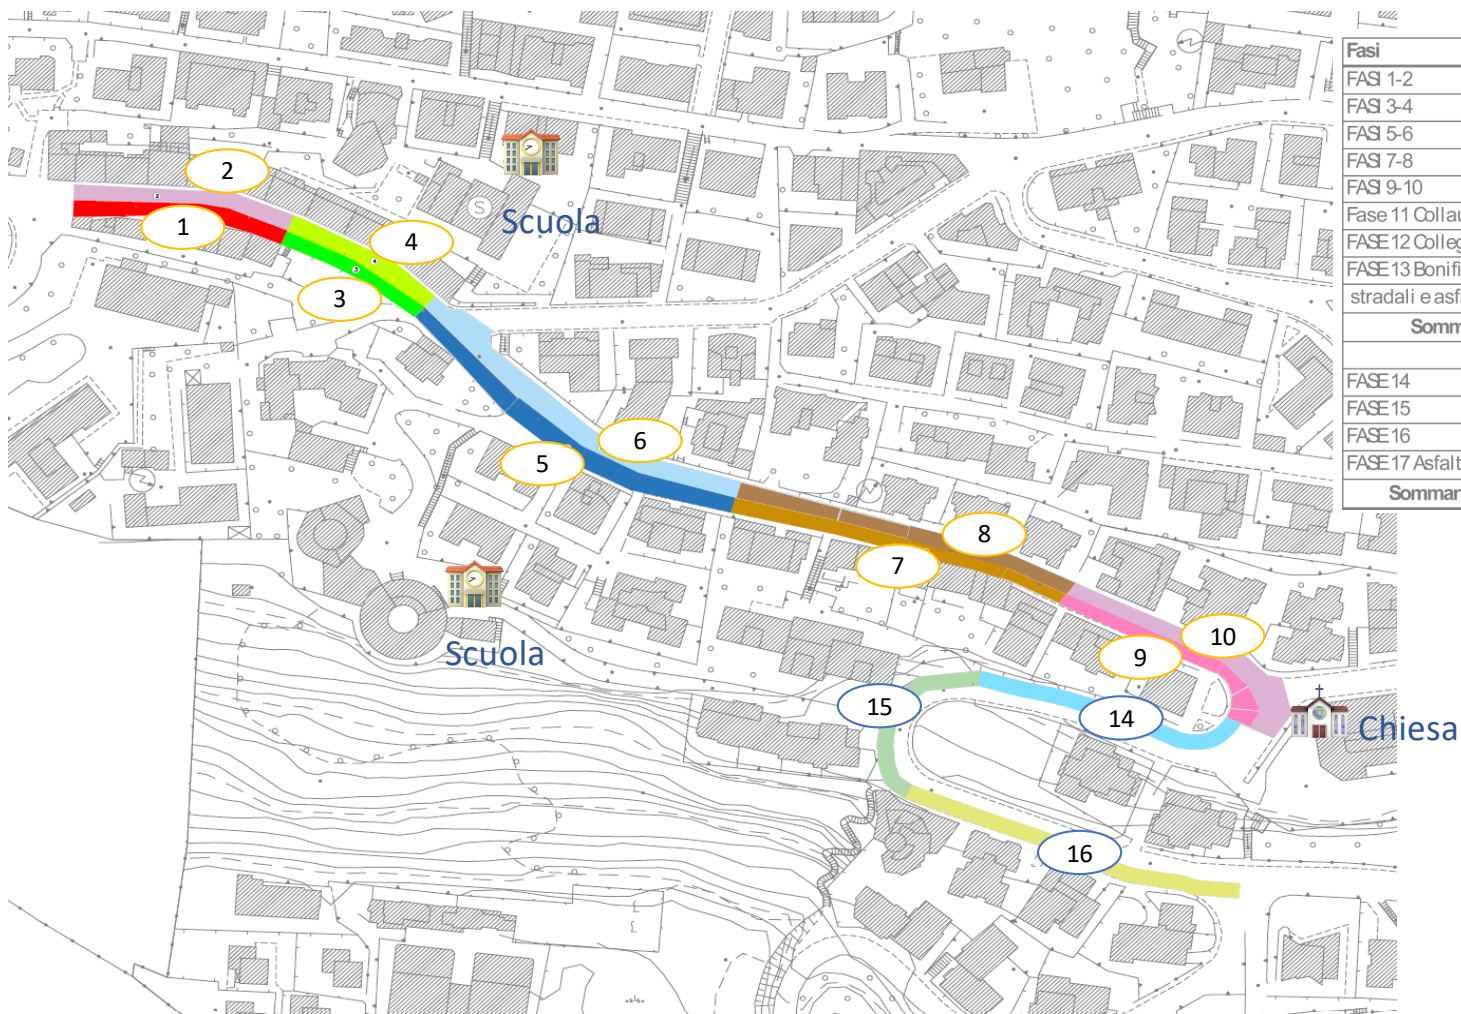

Fasi	lungh.	tempi settimane
FASI 1-2	65	3
FASI 3-4	60	3
FASI 5-6	120	4
FASI 7-8	120	4
FASI 9-10	100	4
Fase 11 Collaudi		2
FASE 12 Collegamenti		2
FASE 13 Bonifiche stradali e asfalti		9
Sommano Via Isonzo		31
FASE 14	90	2
FASE 15	60	1
FASE 16	110	2
FASE 17 Asfalti		3
Sommano Via Del Conero		8


Organizzazione del Cantiere prevista e criticità

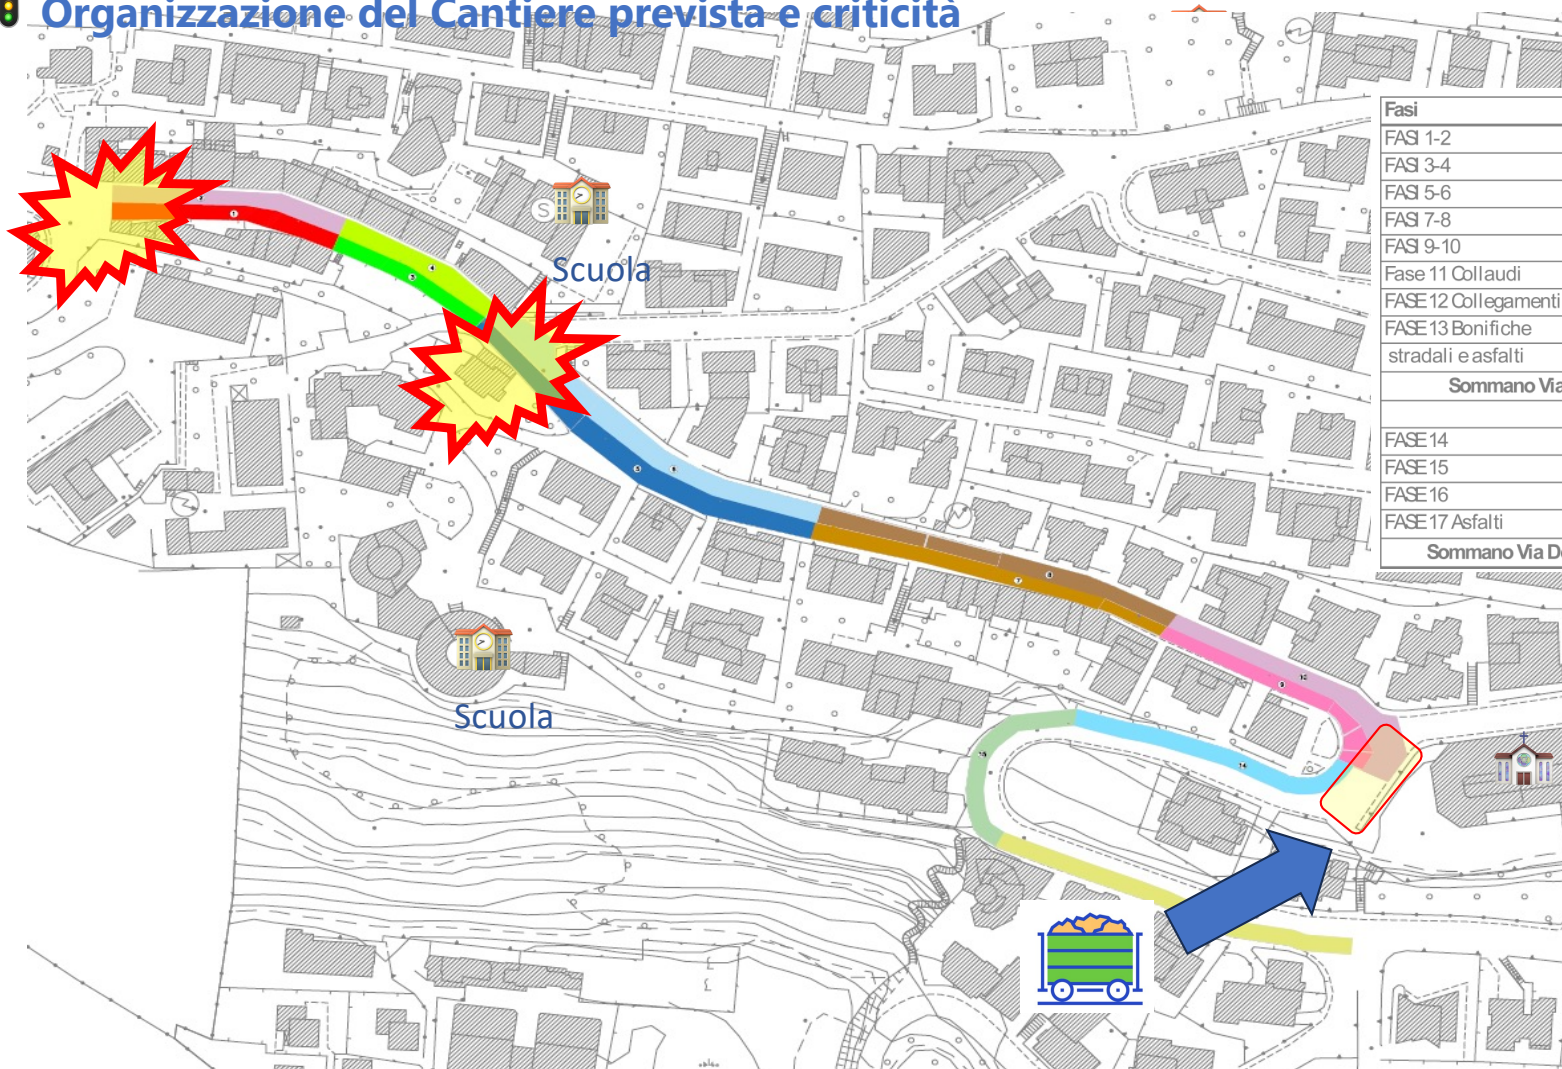


Fasi	lungh.	tempi settimane
FAS 1-2	65	3
FAS 3-4	60	3
FAS 5-6	120	4
FAS 7-8	120	4
FAS 9-10	100	4
Fase 11 Collaudi		2
FASE 12 Collegamenti		2
FASE 13 Bonifiche		
stradali e asfalti		9
Sommano Via Isonzo		31
FASE 14	90	2
FASE 15	60	1
FASE 16	110	2
FASE 17 Asfalti		3
Sommano Via Del Conero		8

viva servizi


Risoluzione criticità FASE I

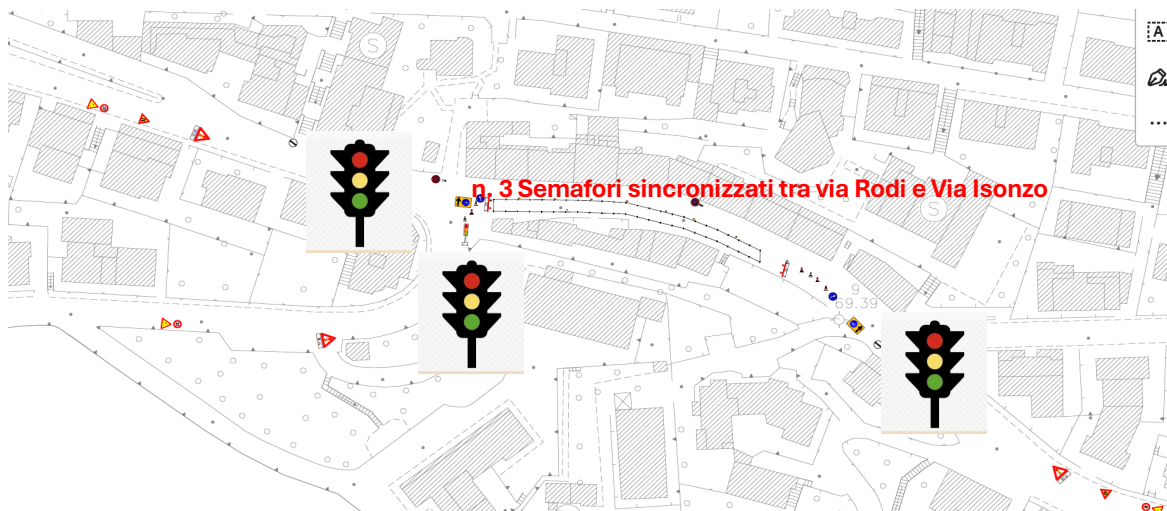


- ✓ Accesso strada limitato (Solo autorizzati e residenti);
- ✓ Lastre carrabili accesso scuole;
- ✓ Movieri durante orario lavoro
- ✓ Mantenimento semafori orari notturni e Sabato/domenica

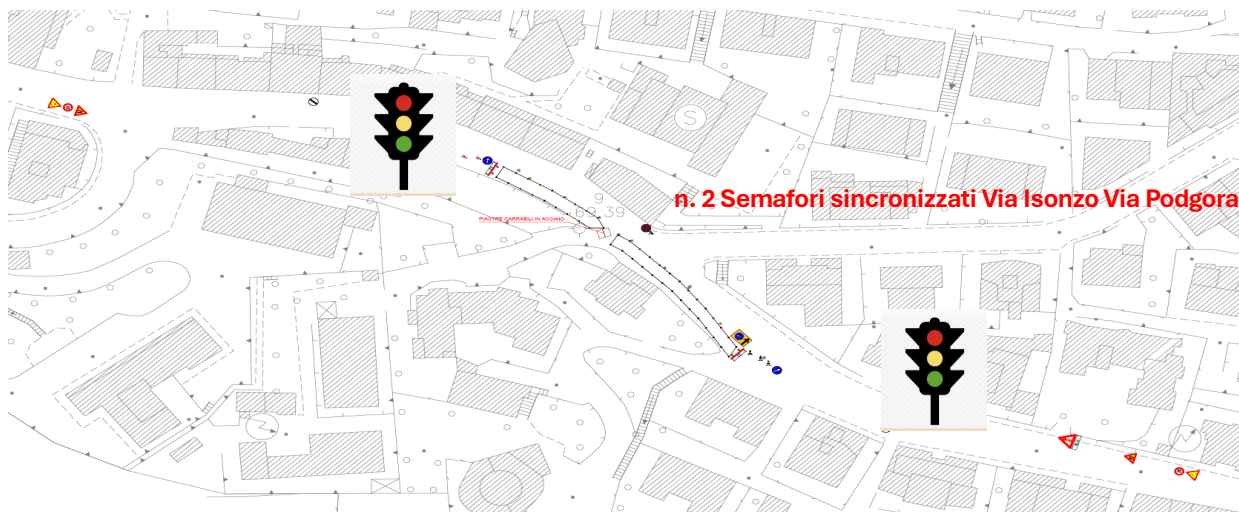


Risoluzione criticità: limitazione accesso Via Isonzo FASE I e II

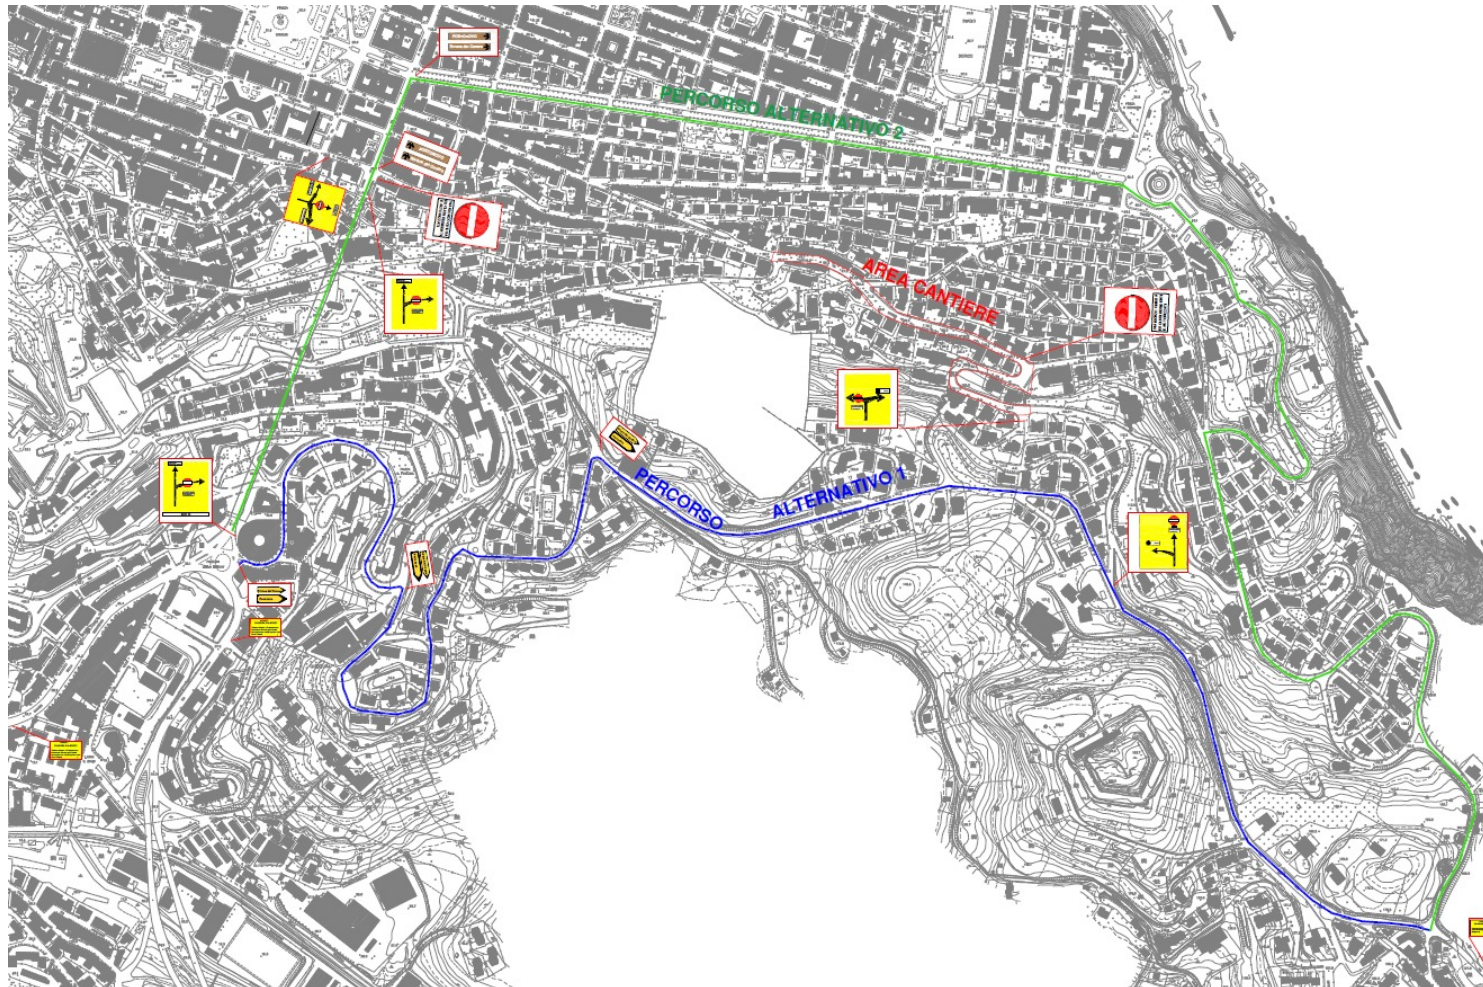


FASE II: Bonifiche stradali del sottofondo stradale

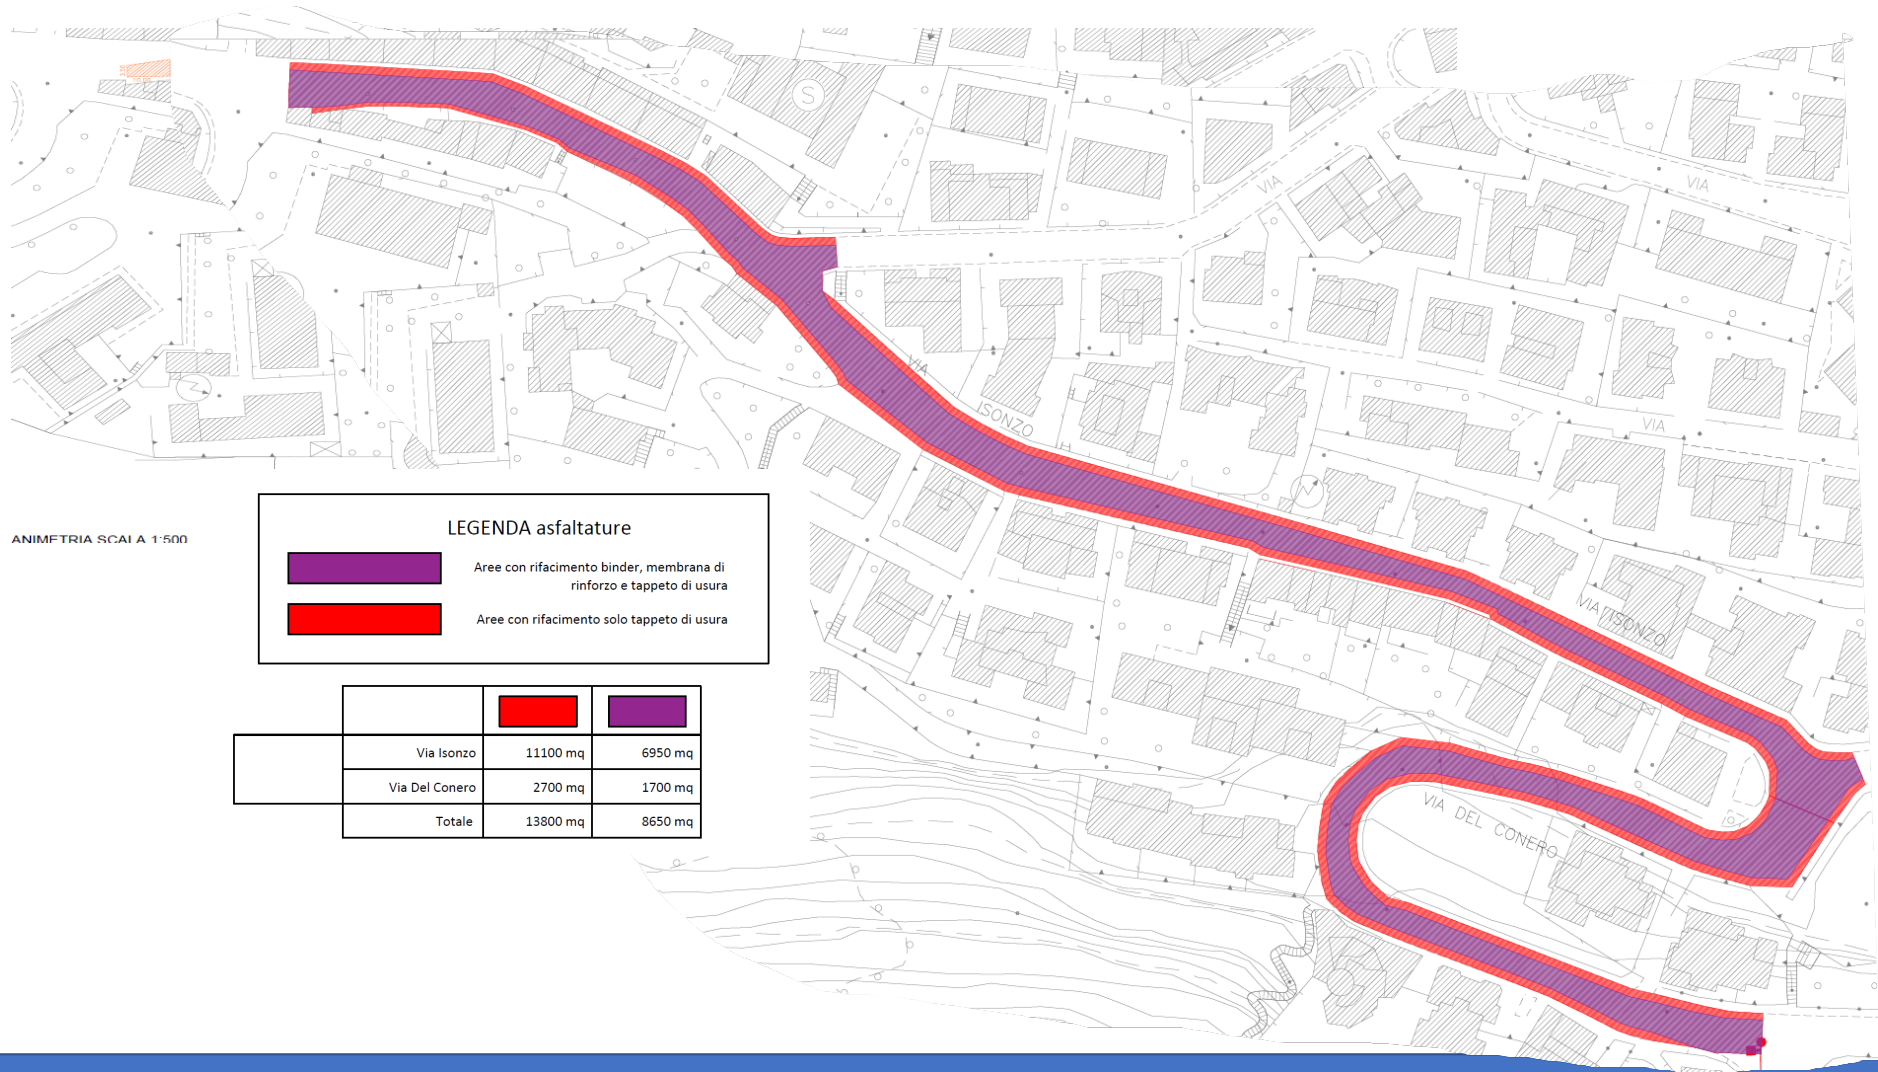

FASE II: Particolari intervento

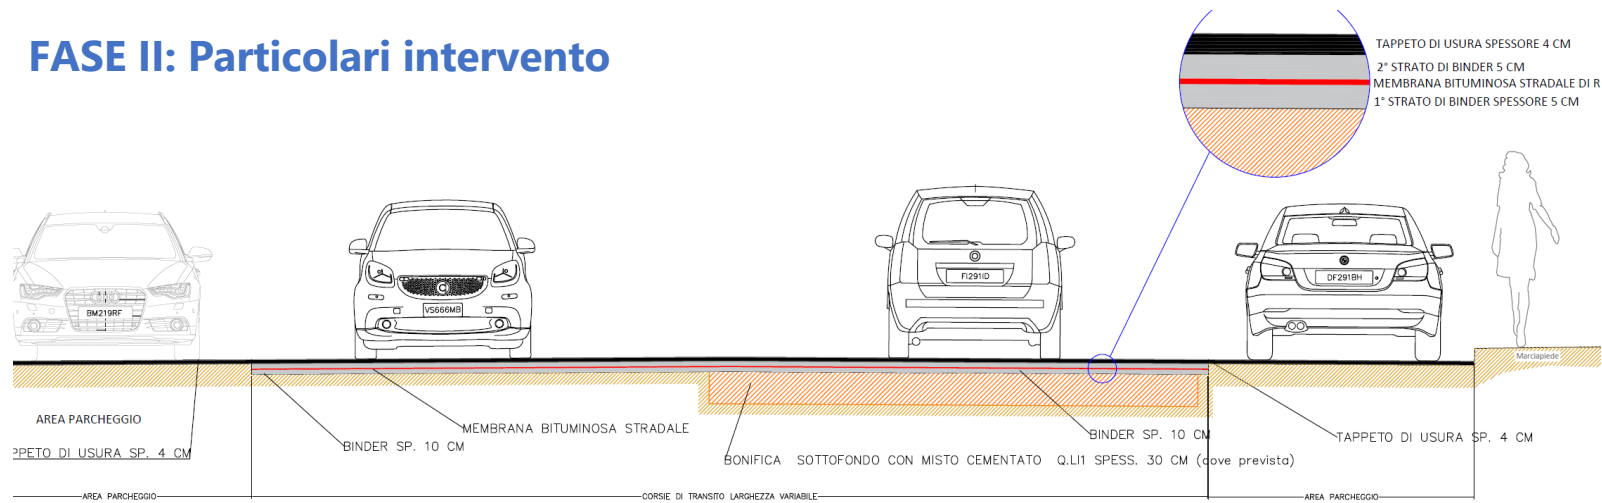

FASE II: prima della FASE II, condizione strada

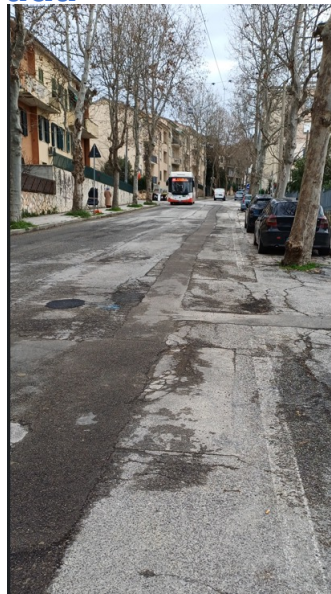



Durata Lavori:

FASI I e II- Via Isonzo.....31 settimane ... 8 mesi

Inizio previsto 7 Aprile (consegna lavori)... termine previsto.. Dicembre

Asfaltatura strada Gennaio/Febbraio 2027

FASI III- IV Via del Conero.....8 settimane....2 mesi

Inizio Previsto Febbraio 2027...termine previsto....Aprile 2027

Asfaltatura strada Maggio 2027



Investimento previsto:

FASE I.... (sottoservizi).....€ 700 Mila (di cui Edma Reti gas)

FASE II.....€ 400 Mila

viva servizi



VIVA Servizi S.p.A.



Grazie

viva servizi
